
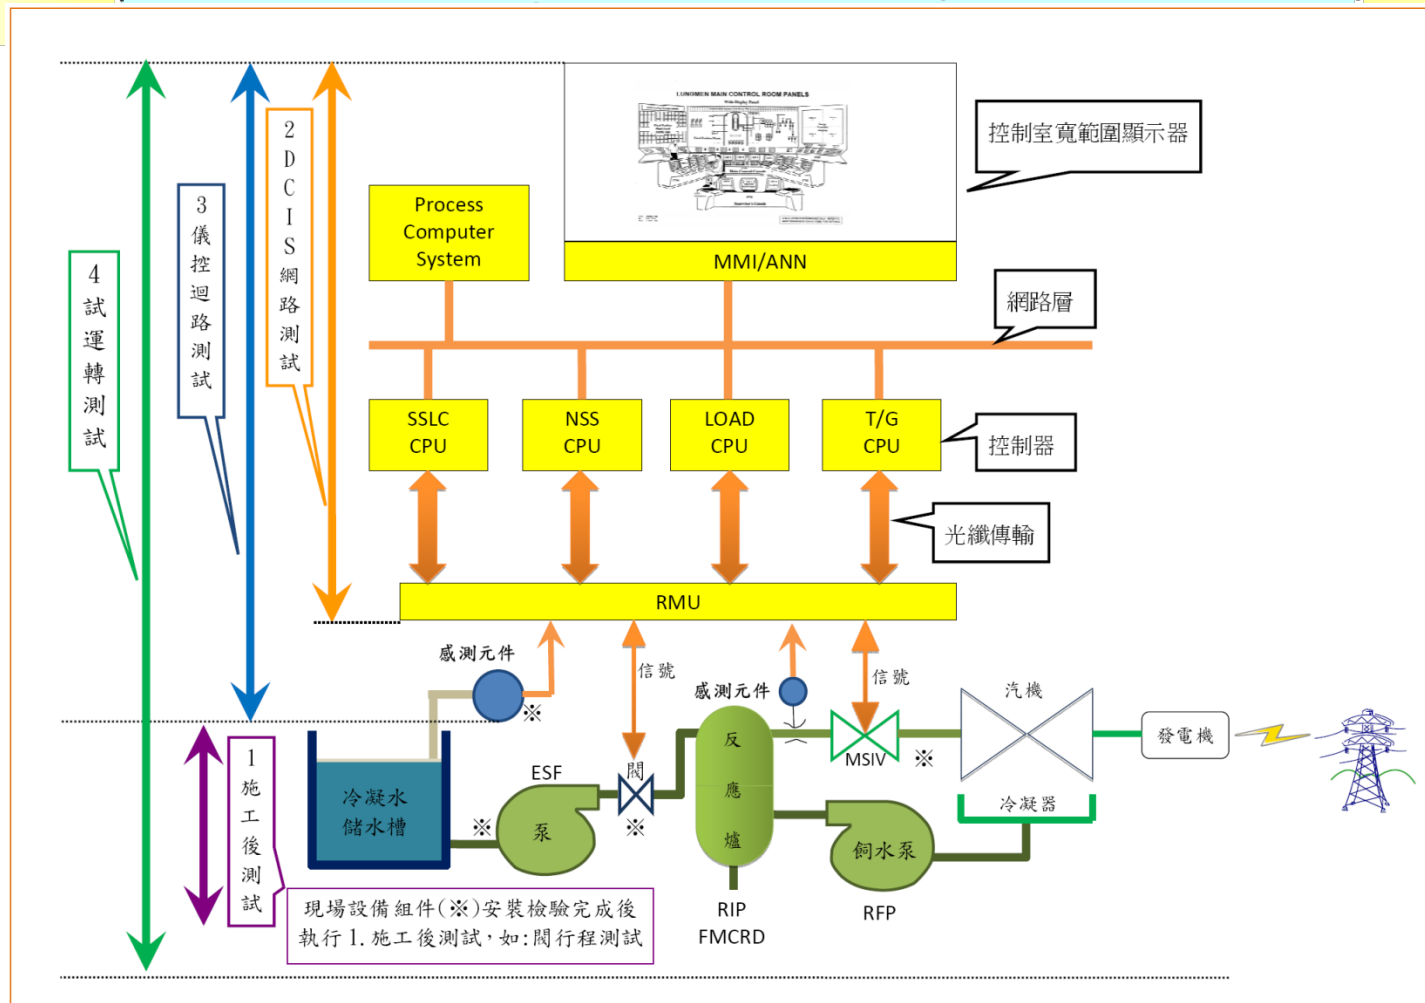


# 試運轉作業與進度

## 龍門電廠


資料統計截止日期：103年6月6日

# 試運轉測試

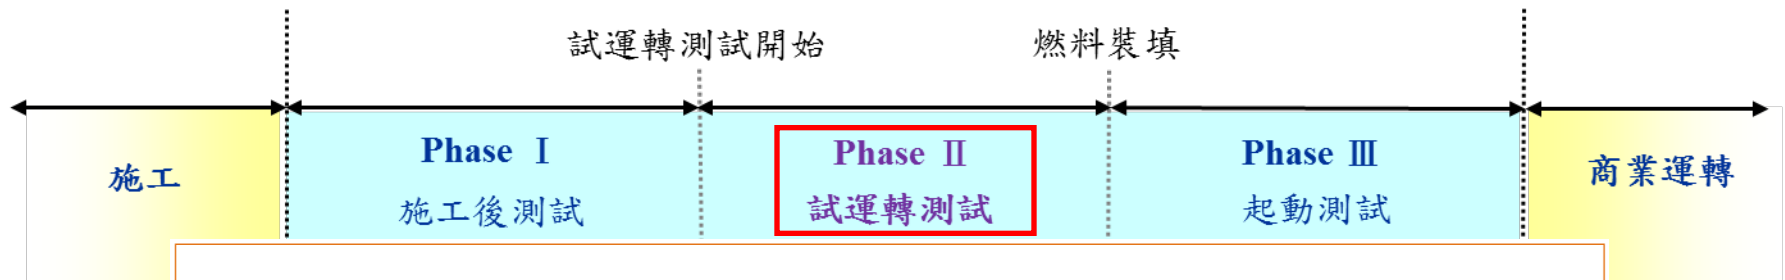


# 一號機測試現況

MMI-PCT完成度(至6/6止)

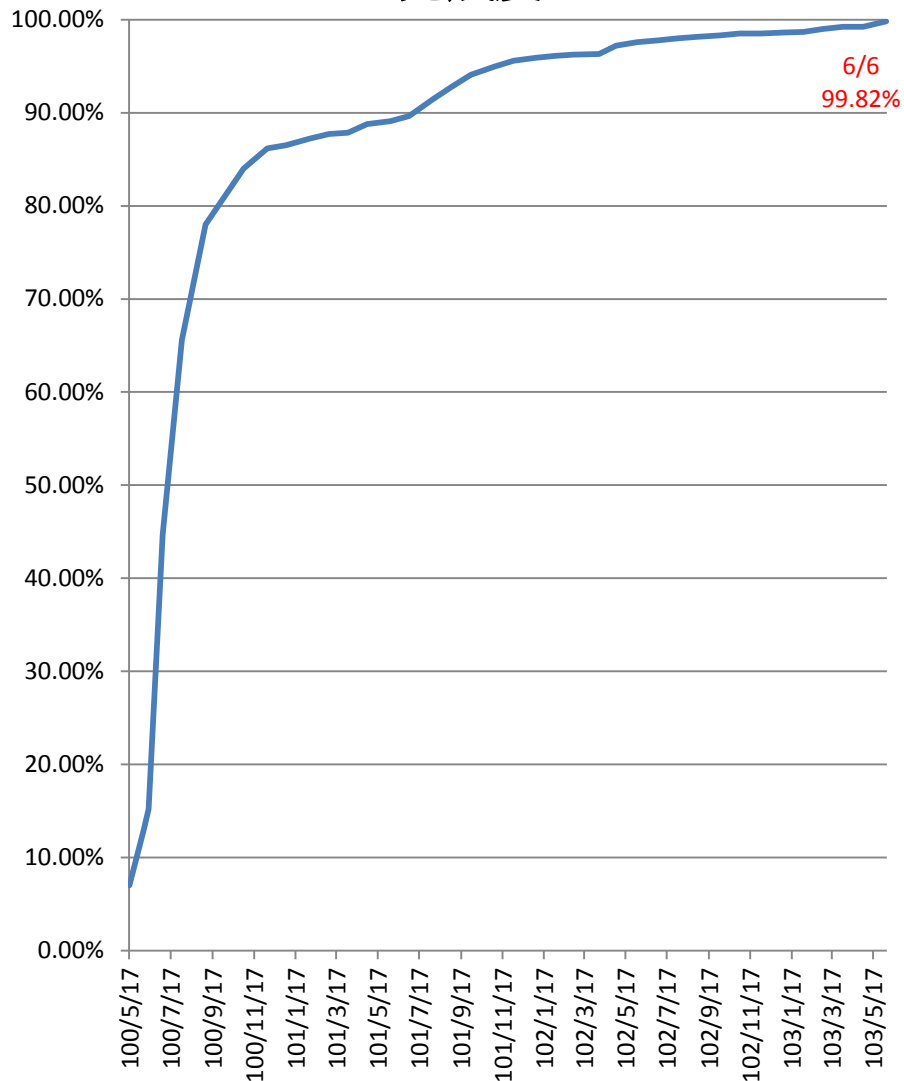


POTP 完成度(至6/6止)

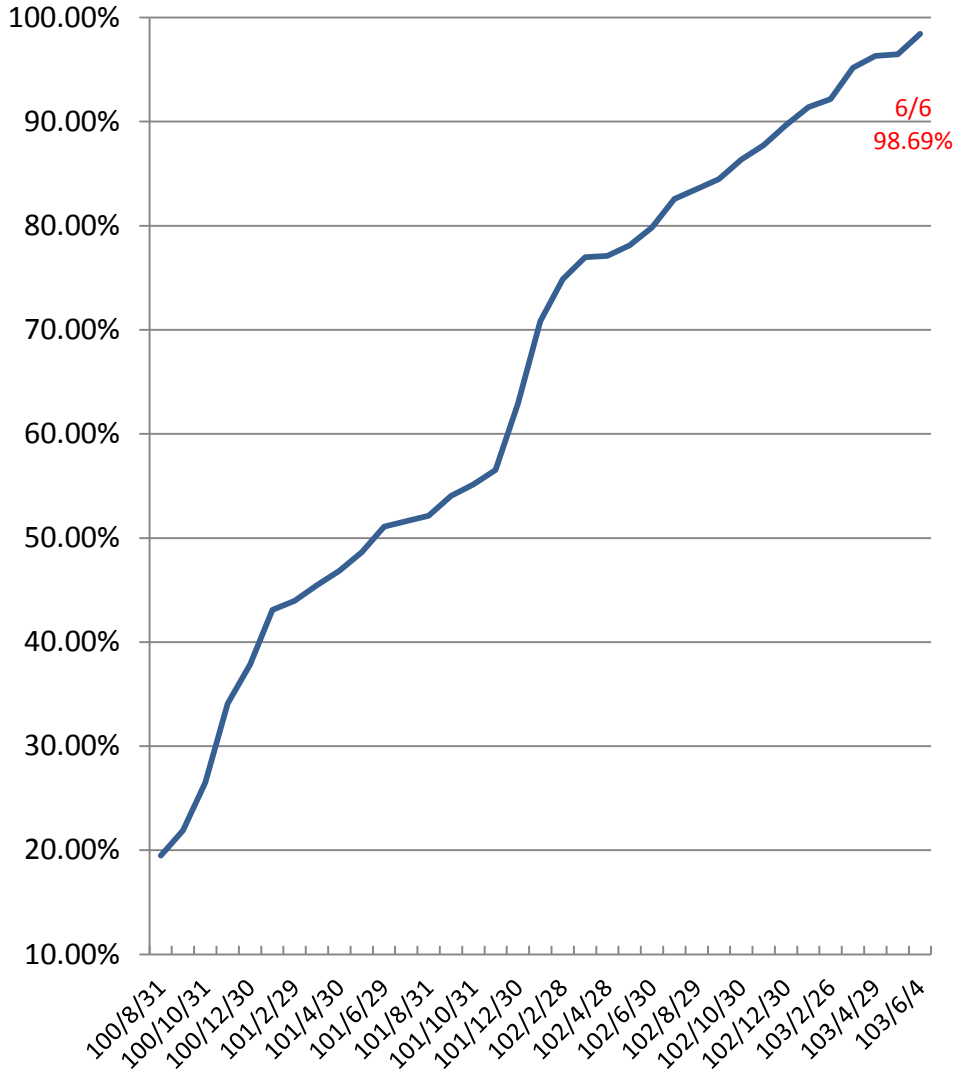

# 一號機系統移交現況

全系統移交趨勢圖

資料統計至 2014/6/6

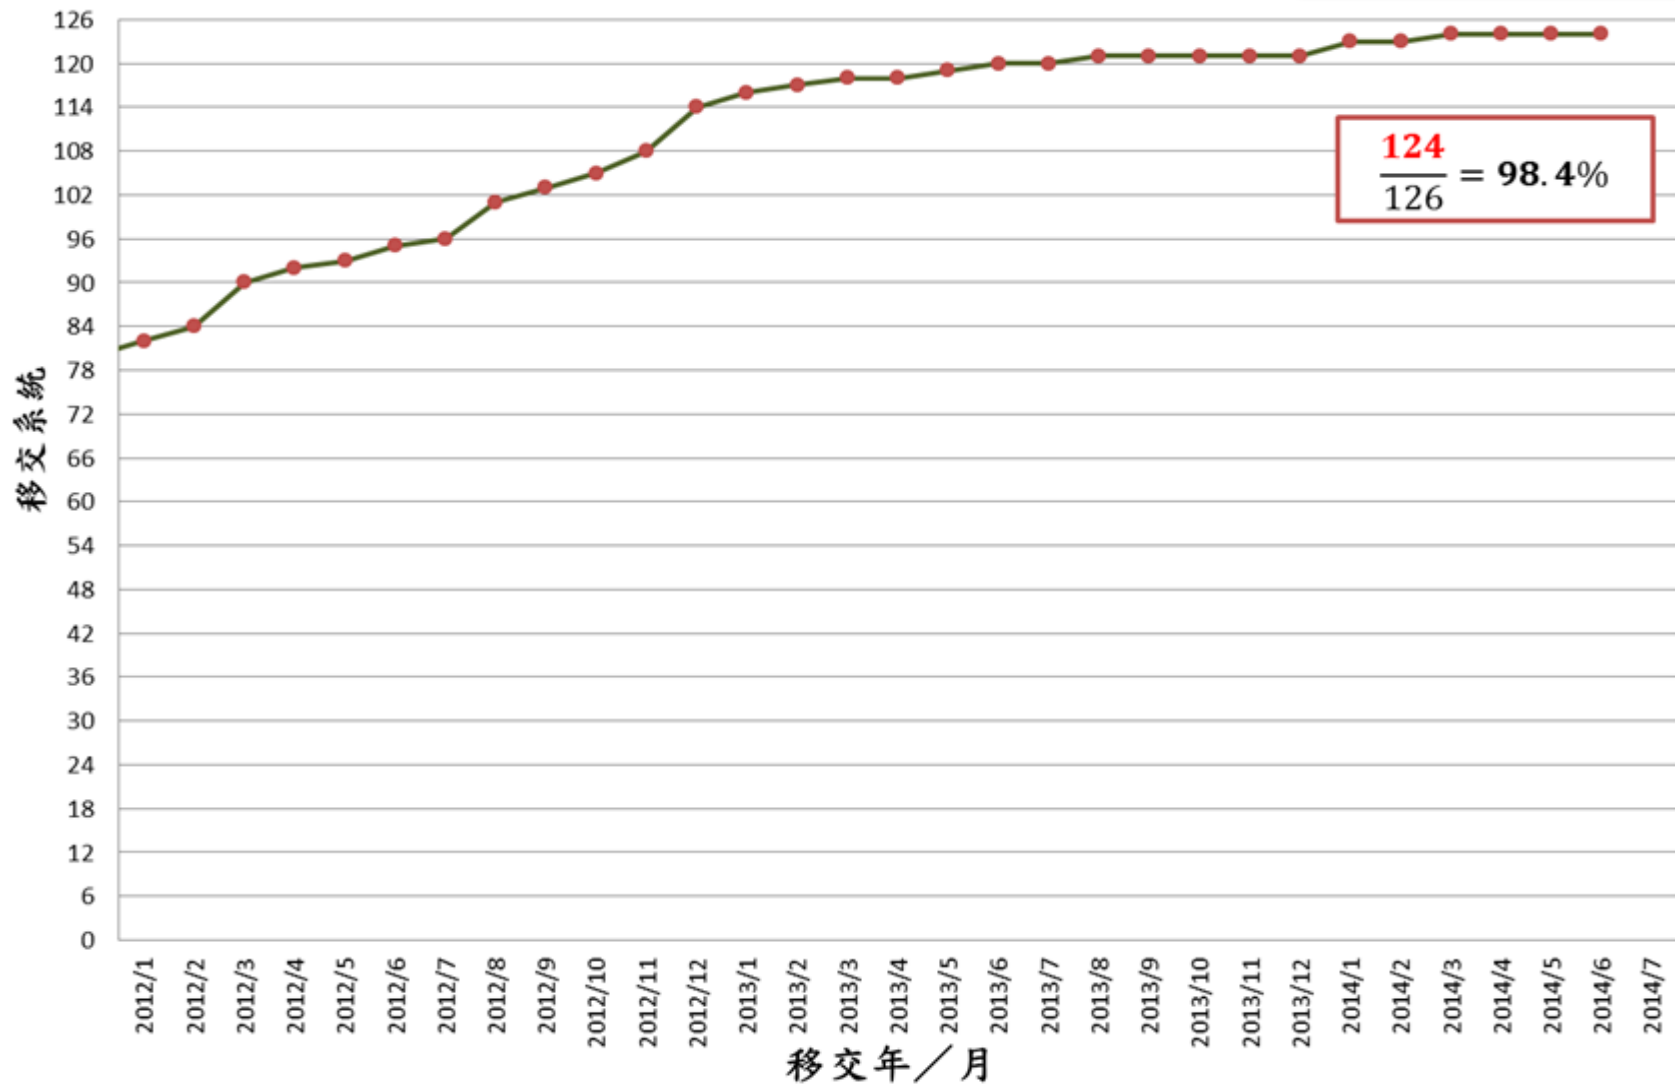

# 測試現況

103.05.13

喪失廠外電源/喪失冷卻水  
測試 (LOOP / LOCA)

103.04進行A串(已完成)  
103.05進行C串(已完成)  
103.06進行B串(已完成)/整體

洩漏偵測隔離(LDI)  
試運轉測試

102.12完成

反應爐壓力槽

102.01~02完成  
反應爐洩漏測試

緊急柴油發電機

102.09/11/12完成  
緊急柴油發電機  
A/B/C台試運轉測試  
103.03完成  
緊急柴油發電機 S台  
試運轉測試

反應器廠房  
洩漏測試

103.05完成

圍阻體大氣控制  
系統充氮測試  
103.03完成

控制廠房  
洩漏測試  
102.12完成

一次圍阻體整體洩  
漏測試 (ILRT)

103.06進行

發電機

102.03完成  
發電機氫氣填充  
及洩放測試

渠道水頭  
損失試驗

101.08完成

大範圍抽真空/  
飼水泵/廢氣系統測試  
101.05~06完成


微調控制棒

101.08完成  
全爐心急停測試

整體性初始功能測試  
103.05完成

餘熱移除系統  
爐心隔離冷卻系統  
102.05~07完成

高壓爐心灌水系統 (HPCF)  
103.06完成

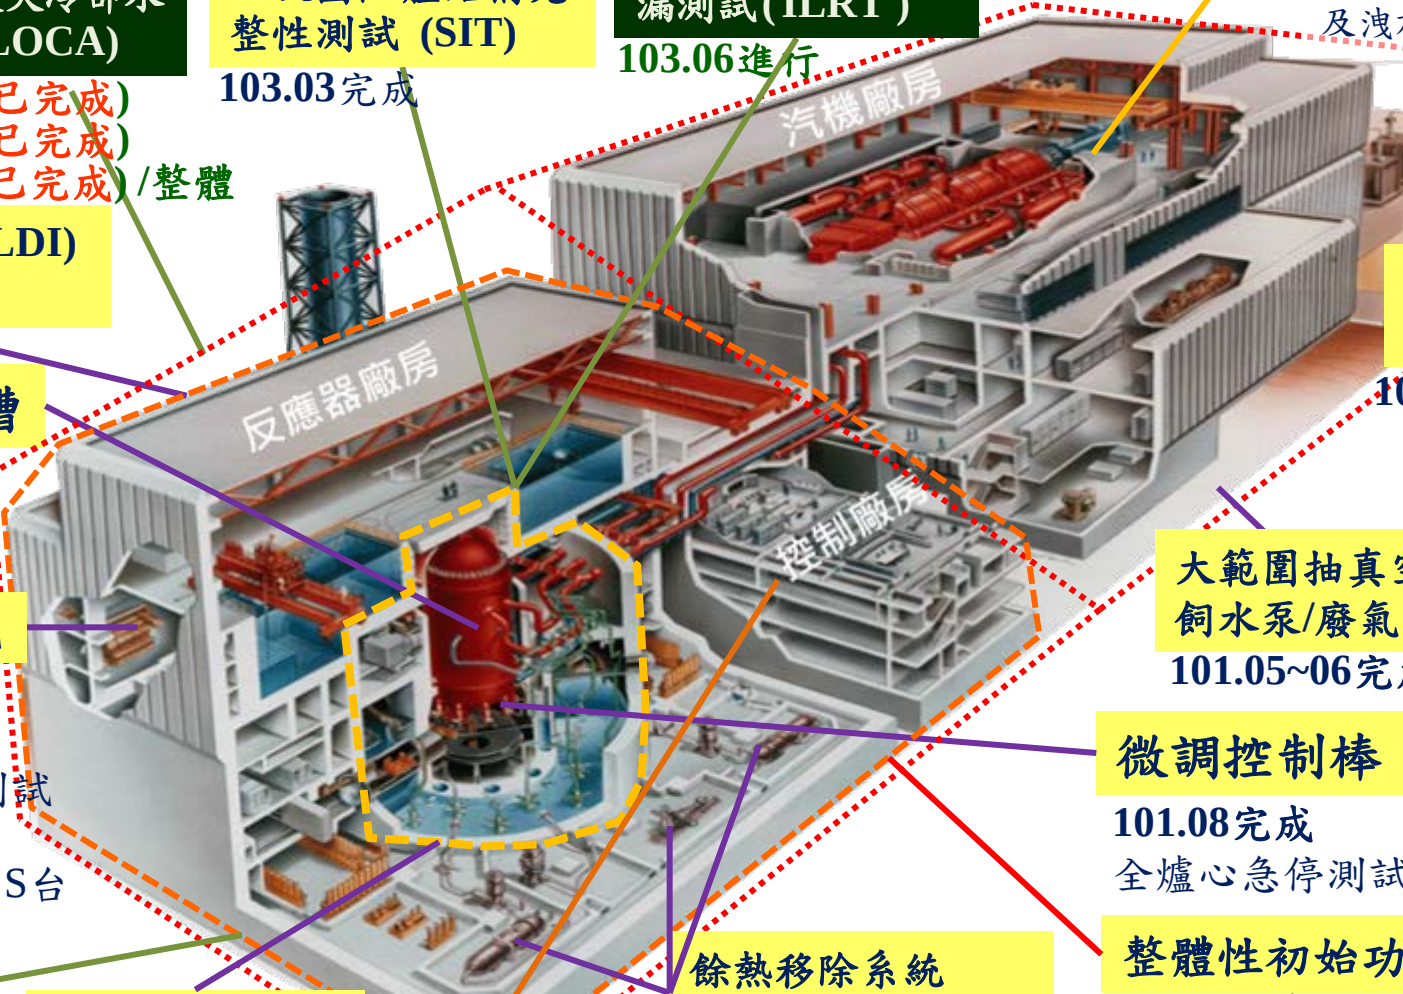



龍門核能發電廠

簡報結束  
敬請指教



台灣電力公司
